ISS Proko OyKauniaisten terveyskeskus ja Villa Bredan rakentamisen valmisteluvaihe

Päällikkö: **Suunnittelija: mtoivola**
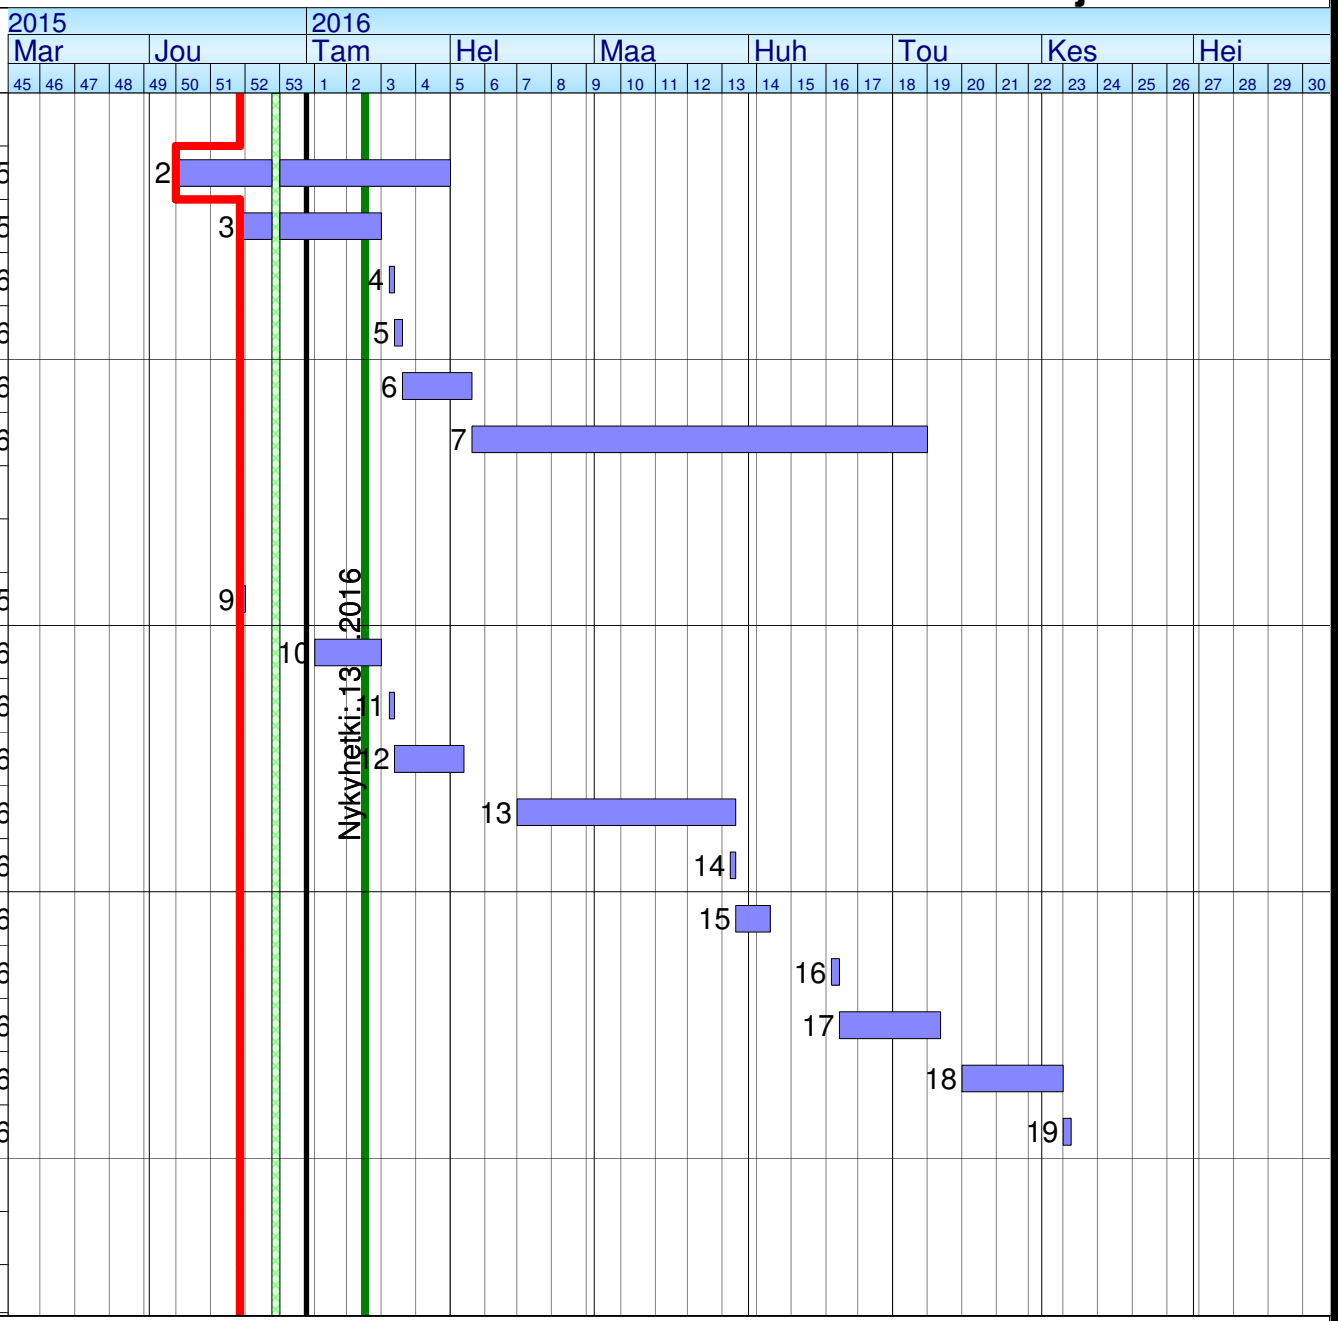
Hierarkia	Selite	Kesto	Alkaa
1	KAUNIAISTEN TERVEYSKES		
2	Suunnittelu	39 pv	7.12.2015
3	Tarjouslaskenta	20 pv	18.12.2015
4	Päätöksenteko (YLK)	1 pv	19.1.2016
5	Päätöksenteko (KH)	1 pv	20.1.2016
6	Valitusaika	10 pv	21.1.2016
7	Rakennusaika	67 pv	4.2.2016
8	VILLA BREDA		
9	Osallistumishakemukset	1 pv	18.12.2015
10	Osallistumh. vastaanotto	10 pv	4.1.2016
11	Osallistujista päätäminen (YLI	1 pv	19.1.2016
12	Valitusaika	10 pv	20.1.2016
13	Tarjouslaskenta	32 pv	15.2.2016
14	Tarjousten avaus	1 pv	29.3.2016
15	Tarjousneuvottelut	5 pv	30.3.2016
16	Päätöksenteko (YLK)	1 pv	19.4.2016
17	Valitusaika	15 pv	20.4.2016
18	Rakentamisen valmistelut	15 pv	16.5.2016
19	Rakentaminen alkaa	1 pv	6.6.2016
